


구청장 공약사업 관리카드

관리번호 1-10	수정4동~초량6동 연결 우회도로 조성					주관부서	건설과 도시계획계	계장	김교중(☎4653)		
								담당자	이나경(☎4654)		
예산액 (백만원)	구분	계	국	시	구	기타	관련부서	-			
	사업비	310	-	-	310	-	추진율				
	확보액	310	-	-	310	-		100% (완료 후 계속)			
	집행액	310	-	-	310	-					
사업기간	2022. 12. ~ 2025. 2.						사업주체	구	교차구분	안내 착수	
공약목표	• 수정4동 ~ 초량6동 우회도로 연결(용역)										
사업개요	• 위 치 : 동구 수정4동(수정APT) ~ 초량6동(초량2 재개발구역)일원 • 규 모 : 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 1식, 재해영향성 검토 용역 1식, 차량방호벽 설치 L=190m • 사업내용 : 수정공원상로(수정4동) 초량2구역(초량6동) 서측 현황도로를 연결하는 도시관리계획(공원조성계획 및 도로) 결정(변경) 및 도로개설을 통하여 주거환경 개선 및 원활한 교통소통 등 인근 주민들의 숙원사업을 해결코자 함.										
추진현황	• 2022. 8. : 용역 사전심사 신청 • 2022. 11. : 용역 계약심사 신청 • 2022. 12. : 도시관리계획(공원조성계획 등)결정(변경)용역 착수 • 2023. 2. : 용역 착수보고회 개최 • 2023. 5. : 용역 중간보고회 개최 • 2023. 8. : 도시관리계획(공원조성계획 등) 결정(변경) 용역 일시정지 및 재해영향성검토 용역 착수 ※'23 구비(1차 추경) 40백만원 • 2023. 12. : 재해영향성검토 용역 완료 및 區도시계획위원회 심의 • 2024. 1. : 도시관리계획(도로) 결정(신설) 및 지형도면 고시 • 2024. 3. ~ 2024. 6. : 도시관리계획(시설:중앙공원) 결정(변경), 공원조성계획 결정(변경) 협의 실시설계 및 용역 완료 • 2024. 12. 공약사업 변경 추진(공약자문단·평가단 회의)										
	구분	변경 전					변경 후				
	추진 목표	- 보상 및 도로개설공사 시행					- 도시관리계획(도로) 결정 및 실시설계용역 1식, - 재해영향성검토 용역 1식 - 차량방호벽설치 L=190m-				
	• 2024. 11~2025. 2. : 구봉중길 일원 차량방호벽 설치 완료(L=190m) ※ 구민공청회 등 실적(개최일자 및 내용 간략히 기재)										
(단위:회)											
설명회,공청회 등		언론·방송 홍보		설문조사, 만족도 등		위원회, 전문가 자문 등		기타			
1회		-		-		-		-			
☎ 2023동수방:1회											

관리번호 1-10	수정4동~초량6동 연결 우회도로 조성	주관부서	건설과 도시계획계	계장	김교중(☎4653)
				담당자	이나경(☎4654)
문제점 및 대책	-				
향후계획	-				



현장사진

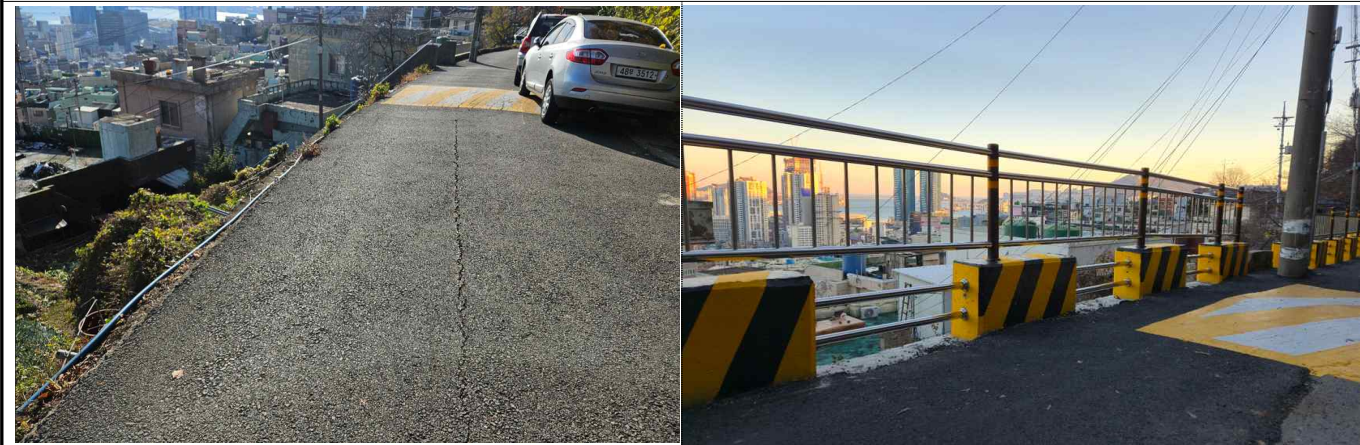

공사 전

공사 후
