



구청장 공약사업 관리카드

관리번호 1-2	고지대 보행자 이동편의시설 확충					주관부서	미래사업단 산복도로비전 계장	계장	이영희(☎6293)											
								담당자	박준봉(☎6292)											
예산액 (백만원)	구분	계	국	시	구	기타	관련부서	-												
	사업비	10,276	-	2,500	7,529 <small>(지방도비 4,000구비금 3,529)</small>	247 <small>(재생기금)</small>														
	확보액	10,276	-	2,500	7,529 <small>(지방도비 4,000구비금 3,529)</small>	247	추진율	16% (정상추진)												
	집행액	6,044	-	1,501	4296	247														
사업기간	2022. 9. ~ 2026. 6.						사업주체	구	과제구분	임기내 완료										
공약목표	고지대 산복도로 계단을 이용하는 교통약자의 안전사고 예방 및 보행환경 개선																			
사업개요	• 위 치 : 동구 내 고지대 각 지구별 1개소 총 4개소 • 규 모 : 경사형E/V, 수직E/V, 보행데크 • 내 용 : 고지대 이동편의시설 설치																			
추진현황	<div>• 2022. 12. : 기본계획 수립 용역 착수</div> <div>• 2023. 5. : 기본계획 수립 용역 최종보고</div> <div>• 2023. 7. : 기본계획 수립 용역 준공</div> <div>• 2023. 8. : 15분 도시 조성(제2차 해피챌린지) 공모 선정(시비 2,500백만원 확보)</div> <div>• 2023. 8. : 갈매샛길 공모 선정(시비 750백만원 확보)</div> <div>• 2024. 4. : 이중섭계단 종점부 승강장 사유지 보상 완료(247백만원)</div> <div>• 2024. 4~7. : 디자인 및 실시설계 협상에 의한 계약 추진</div> <div>• 2024. 7. : 고지대 이동편의시설 확충사업 디자인 및 실시설계 착수</div> <div>• 2024. 10. : 고지대 이동편의시설 확충사업 중간보고</div> <div>• 2024. 11. : 고지대 이동편의시설 확충사업 주민설명회, 계약심사(부산시)</div> <div>• 2024. 11. : 지방소멸대응기금 공모 선정(기금 6,700백만원 확보)</div> <div>• 2024. 12. : 고지대 이동편의시설 확충사업 토목건축 발주 및 착공</div> <div>※ 구민공청회 등 실적(개최일자 및 내용 간략히 기재)</div> <div>(단위:회)</div> <table><tr><td>설명회,공청회 등</td><td>언론·방송 홍보</td><td>설문조사, 만족도 등</td><td>위원회, 전문가 자문 등</td><td>기타</td></tr><tr><td>18회</td><td>10회</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>● 2023동순방:3회, 2024동순방:13회, 비전선포식:1회, 주민설명회:1회</div>										설명회,공청회 등	언론·방송 홍보	설문조사, 만족도 등	위원회, 전문가 자문 등	기타	18회	10회			
설명회,공청회 등	언론·방송 홍보	설문조사, 만족도 등	위원회, 전문가 자문 등	기타																
18회	10회																			
문제점 및 대책	• 초량48계단 보상협의 ⇒ 사업타당성 설득하여 보상협의 조속 추진																			
향후계획	• 2026. 6. : 사업준공																			
<div></div>																				
현장사진																				




초량 168계단 경사형 E/V
(23억)



168계단 연결 48계단
경사형 E/V(15억)

이동편의시설 확충

- 총 7개소(지구별 1개소 이상)
- 총 사업비 : 196억
- 사업 기간 : 2022.

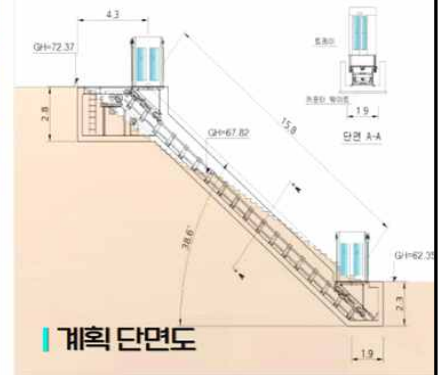


계획 단면도



수정4동 공영주차장
경사형 E/V(37억)



계획 현황도

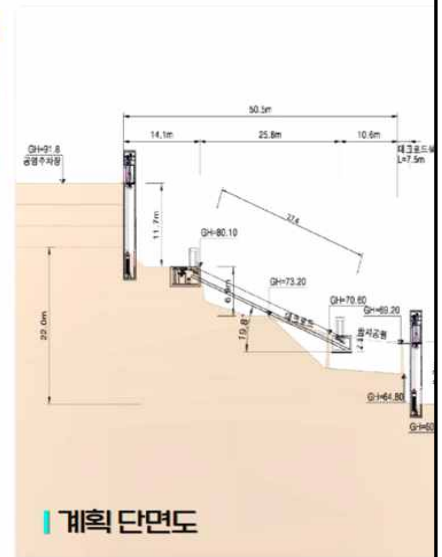

계획 단면도




경남여고 경사형E/V
(16.5억)



동여중 경사형 E/V
(43.5억)



계획 평면도

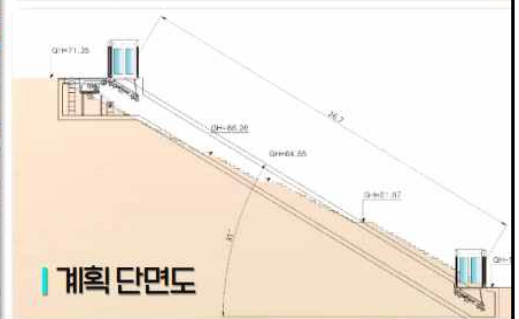

계획 단면도
